Harmonogram

BAK stav.společnost,a.s.

Mnichovo Hradiště - rekonstrukce a dostavba kanalizace

23.8.2011
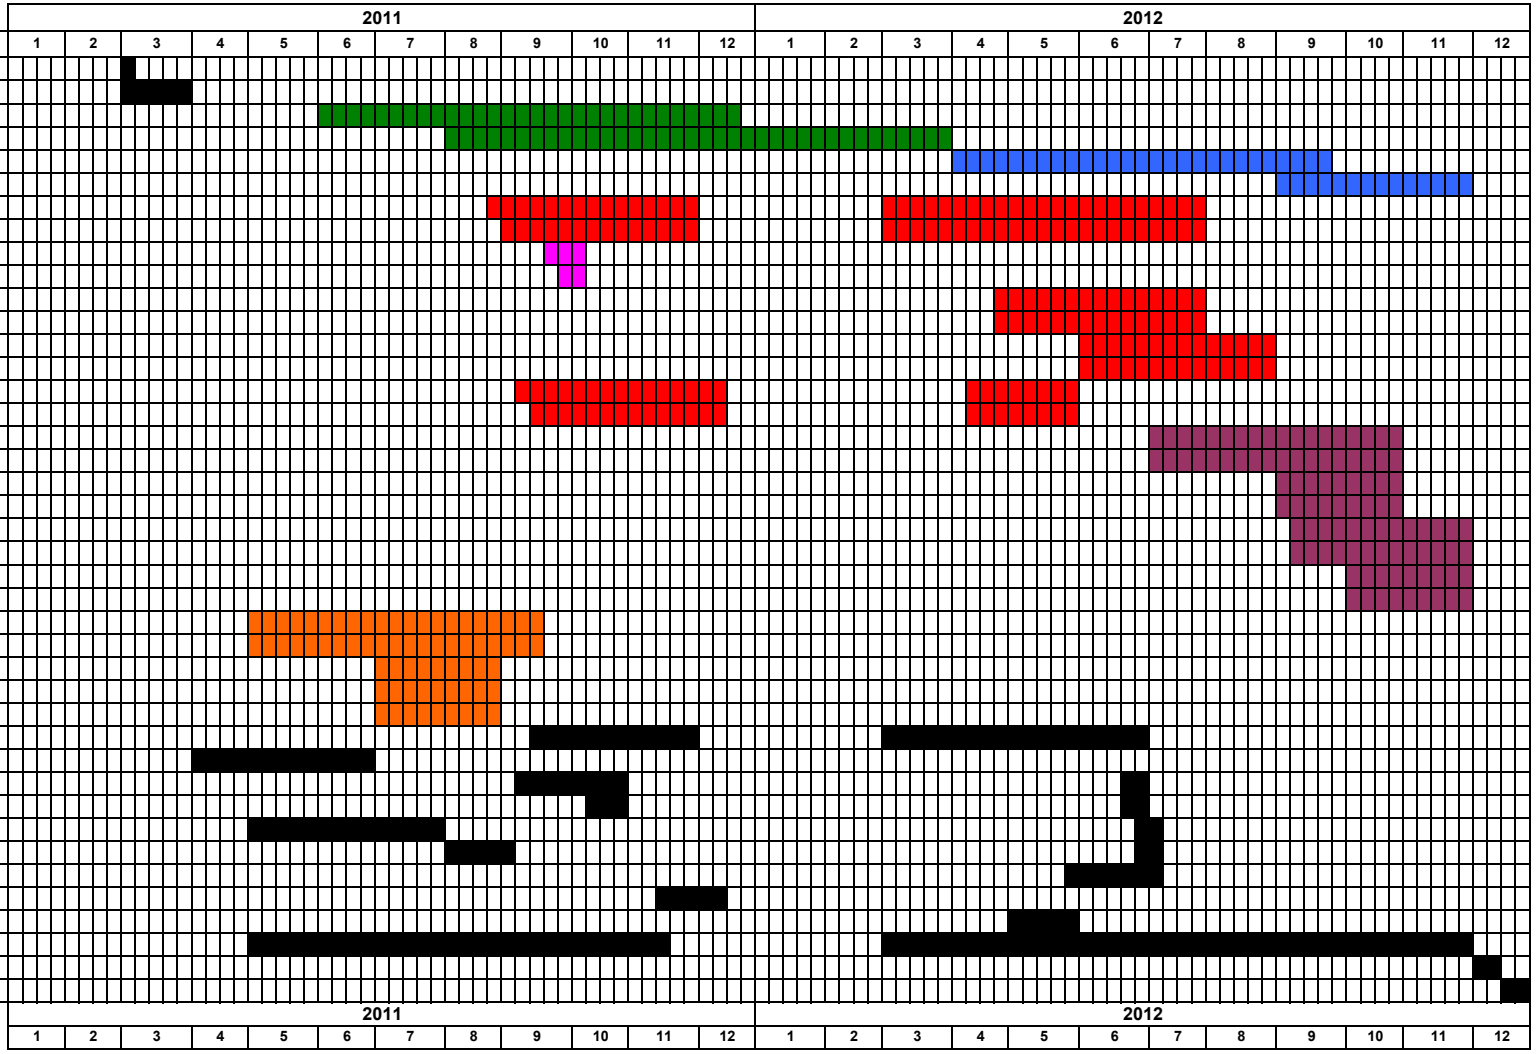
Objekt	Popis	bm	týdnů
	předání staveniště		
	zařízení staveniště		2
SO 01	ražená stoka AA	440	30
SO 04	objekty na stoce AA		34
SO 02	hloubená stoka B	289	27
SO 03	hloubená stoka B1	115	13
SO 01V	stoka S1 vč.S1a,S1b,S1c	967	31
SO 03V	stoka S1 přípojky	373	30
SO 01V	stoka S1b	37	3
SO 03V	stoka S1 přípojky	8	2
SO 01V	stoka S1-1	170	13
SO 03V	stoka S1-1 přípojky	61	13
SO 01V	stoka S1-2	234	13
SO 03V	stoka S1-2 přípojky	206	13
SO 01V	stoka S1-3 vč.S1-3a	282	13
SO 03V	stoka S1-3 přípojky	103	13
SO 01V	stoka S2 vč.S2a	652	17
SO 03V	stoka S2 přípojky	183	22
SO 01V	stoka S2-1	83	8
SO 03V	stoka S2-1 přípojky	15	8
SO 01V	stoka S2-2	254	13
SO 03V	stoka S2-2 přípojky	105	15
SO 01V	stoka S2-3	107	9
SO 03V	stoka S2-3 přípojky	35	9
SO 01V	stoka S3 vč.S3a	502	17
SO 03V	stoka S3 přípojky	223	17
SO 01V	stoka S3-1	83	9
SO 03V	stoka S3-1 přípojky	31	8
SO 01V	stoka S4 = stoka D	19	9
SO 02V	výtlak V1	674	31
SO 02V	výtlak V2	863	12
SO 04	ČS 1 vš.PS		17
SO 07	příp.NN k ČS 1		4
SO 05	ČS 2 vč.PS		21
SO 07	příp.NN k ČS2		8
SO 06	přeložky vodovodu 1	42	4
SO 06	přeložky vodovodu 2	98	4
SO 06	přeložky vodovodu 3	49	5
	obnova komunikací		69
	výstupní kontrola		2
	předání stavby
